# ALAIN WOUTERS ASSOCIÉ



# CONSTRUCTION BOIS . EXPERTISE INTEGRER LE BOIS DANS LES GRANDS PROJETS COMMENT ALLER PLUS HAUT?

LES RENCONTRES FILIÈRE BOIS NAMUR LE 24 MARS 2017



#### Bilan carbone


Comparaison énergie grise


Cette étude compare un procédé constructif béton à un système constructif bois.

L'étude prend aussi en considération le pouvoir calorifique du bois et sa valorisation énergétique en fin de vie pour aboutir à un nombre d'années de production photovoltaïque économisée.

LA PLANÈTE



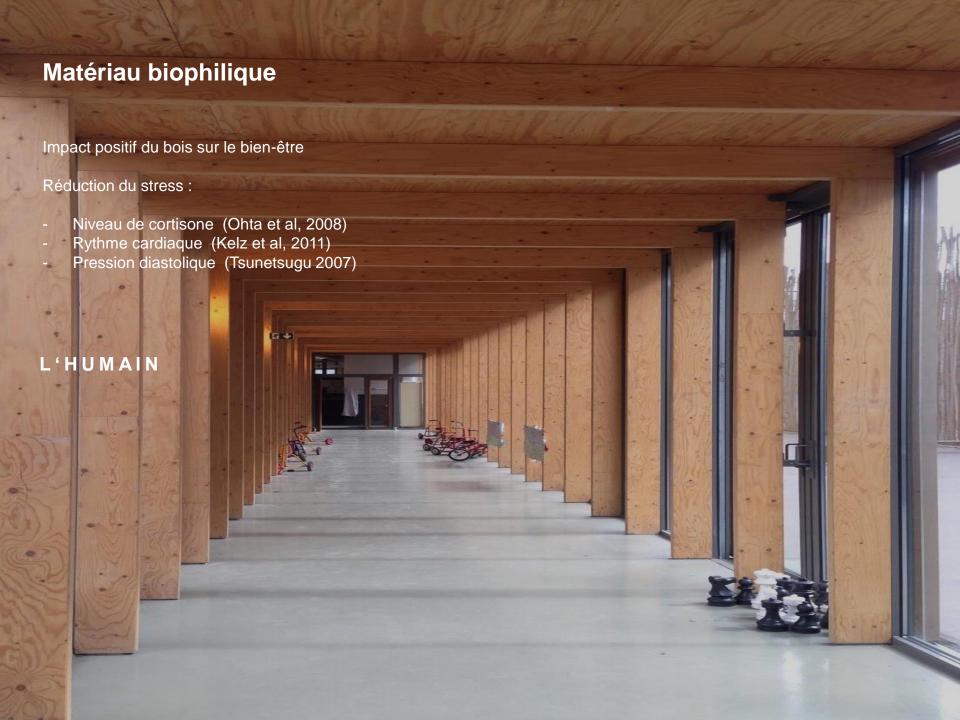

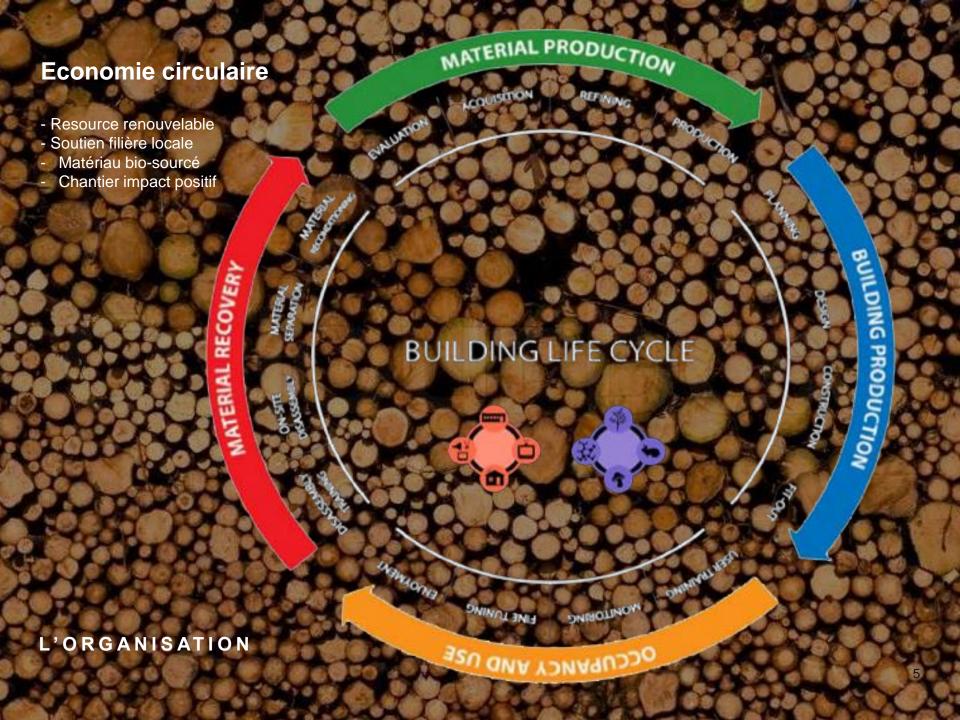

## PRÉJUGÉS VIS-À-VIS DE LA CONSTRUCTION BOIS

Feu

- faible conductivité thermique
- bonne stabilité structurelle
- faible émission de fumées toxiques

Acoustique

- assurer l'étanchéité à l'air
- désolidarisation des parois



- préfabrication
- gain de temps
- isolant naturel
- gain de place

Nuisibles

- traitement insecticide naturel dans la masse
- régulateur thermique et hygrothermique

Hauteur

- exemples en Australie(10), Norvège (20),
   Canada (30) optimal 8 étages
- bonne résistance sismique
















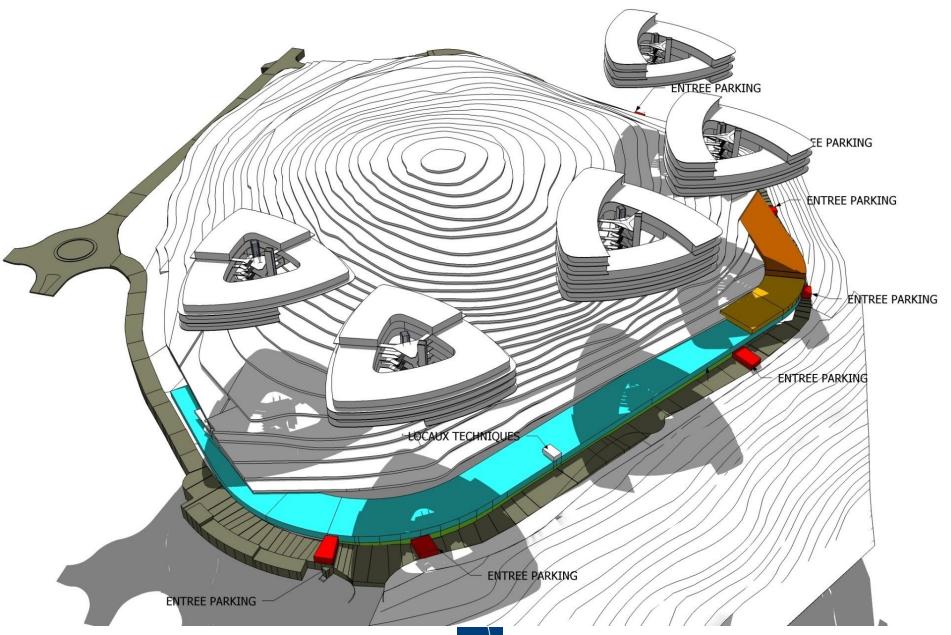






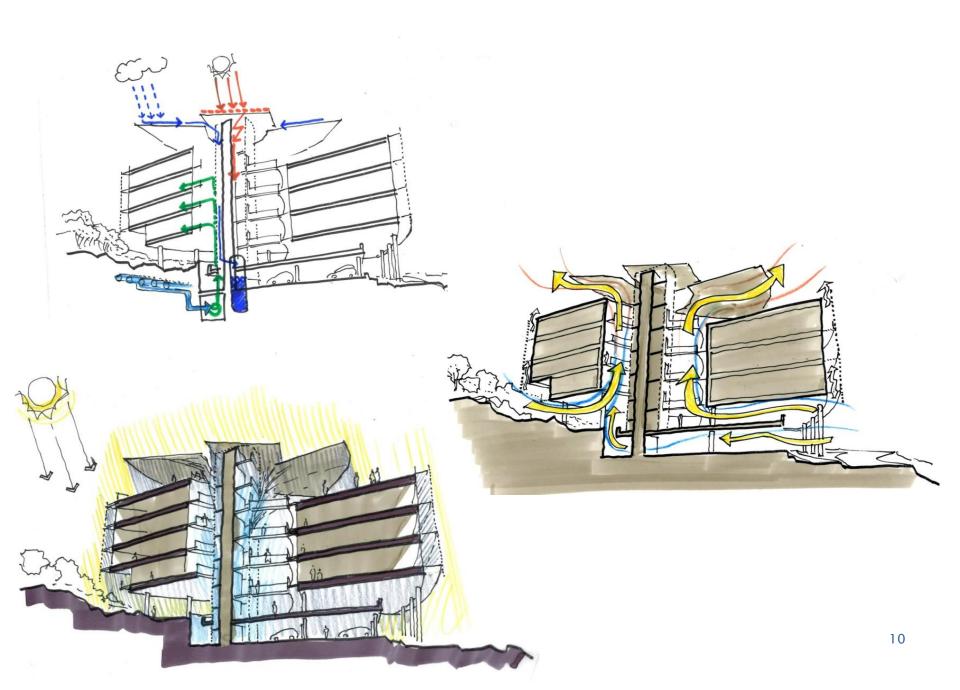









CIRCULATIONS VERTICALES
INTERIEURES





CIRCULATIONS VERTICALES
EXTERIEURES



MODELE COMPLET






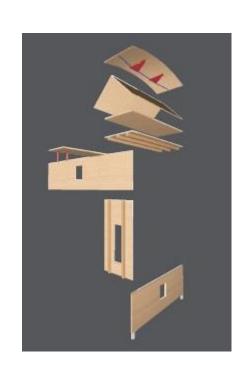





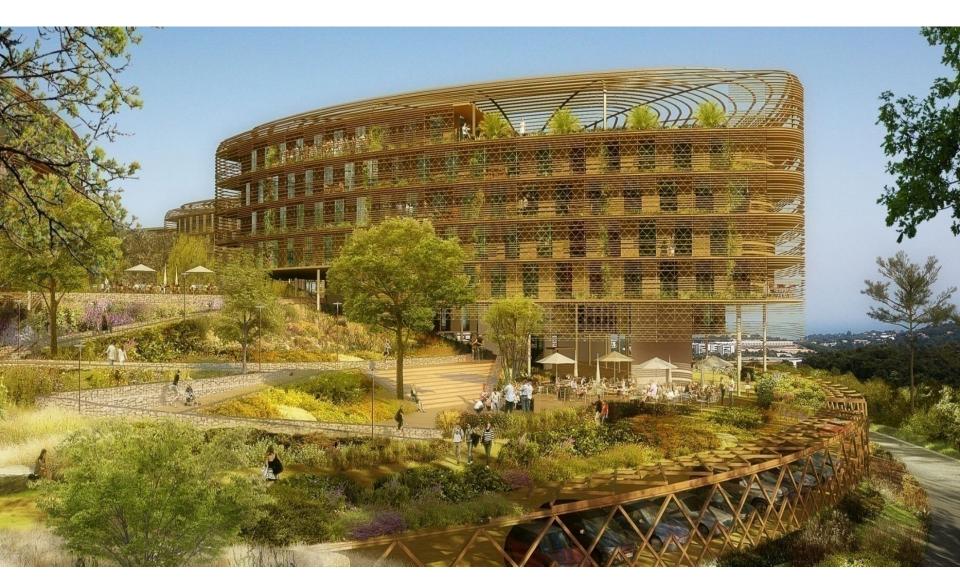









#### **Concept:**

- Nouveau système d'habitat évolutif à empreinte écologique positive.
- Grande évolutivité et flexibilité des espaces
- Développement dans les trois dimensions = CUBE.






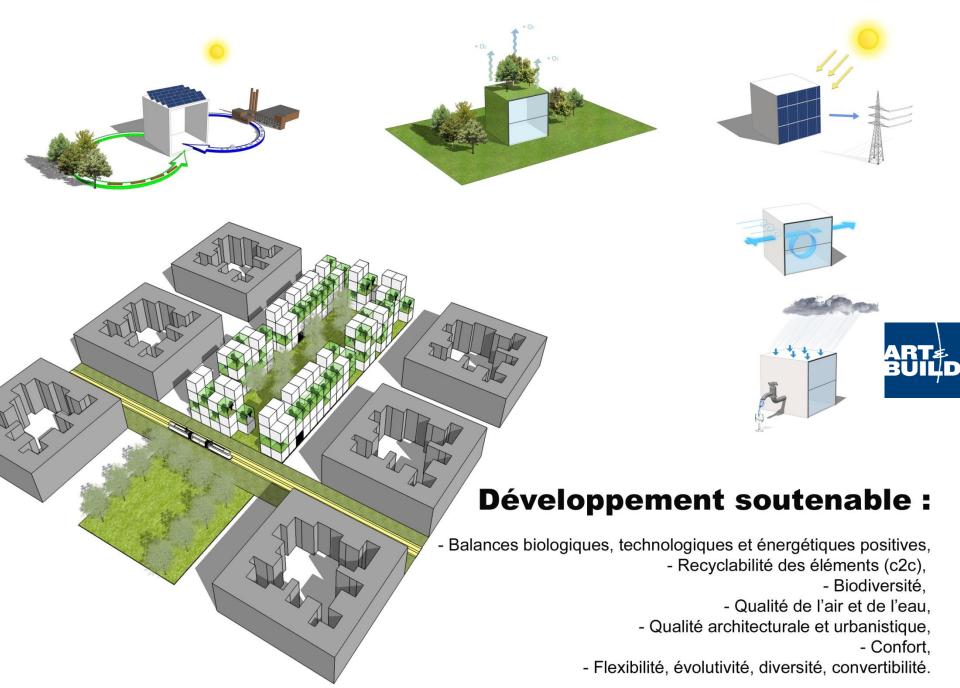









#### Flexibilité - Evolutivité :

- Combinaisons multiples = diversité et évolutivité
- Module autoportant
- Eléments structurels combinés
- Libération totale de l'espace



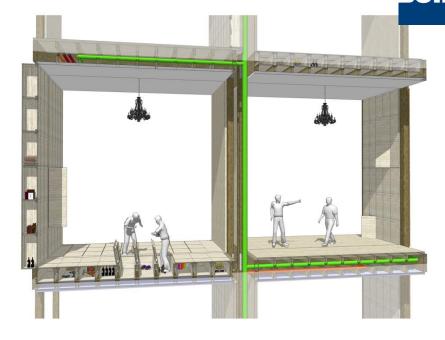

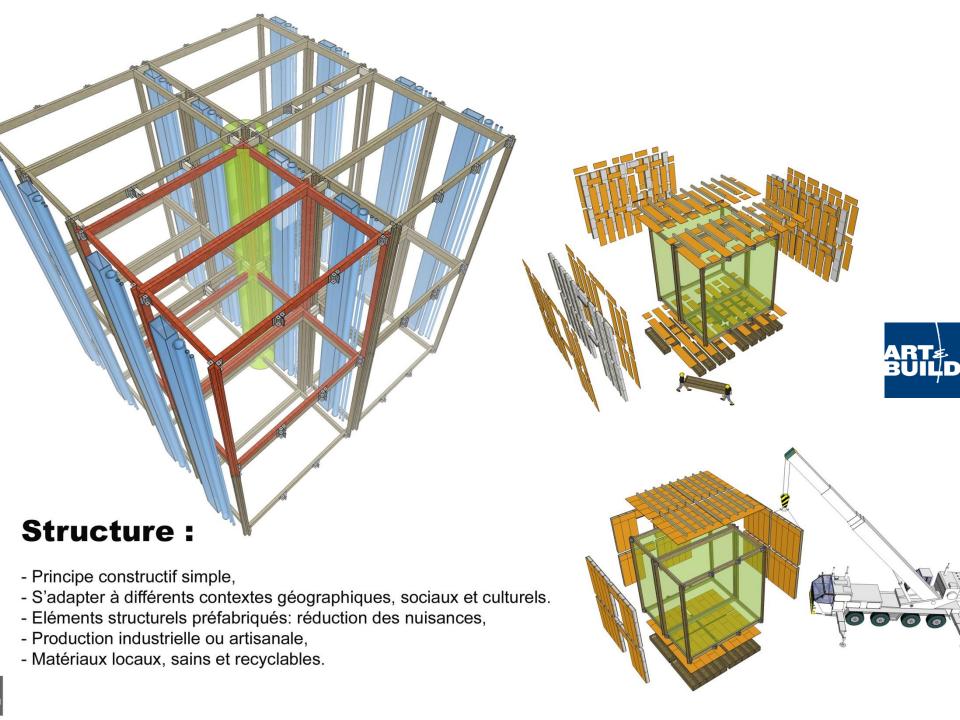



Contrat cadre pour Airbus Plusieurs études sur différents sites, de multiples configurations de plans, plusieurs hauteurs (...)

EADS ESS























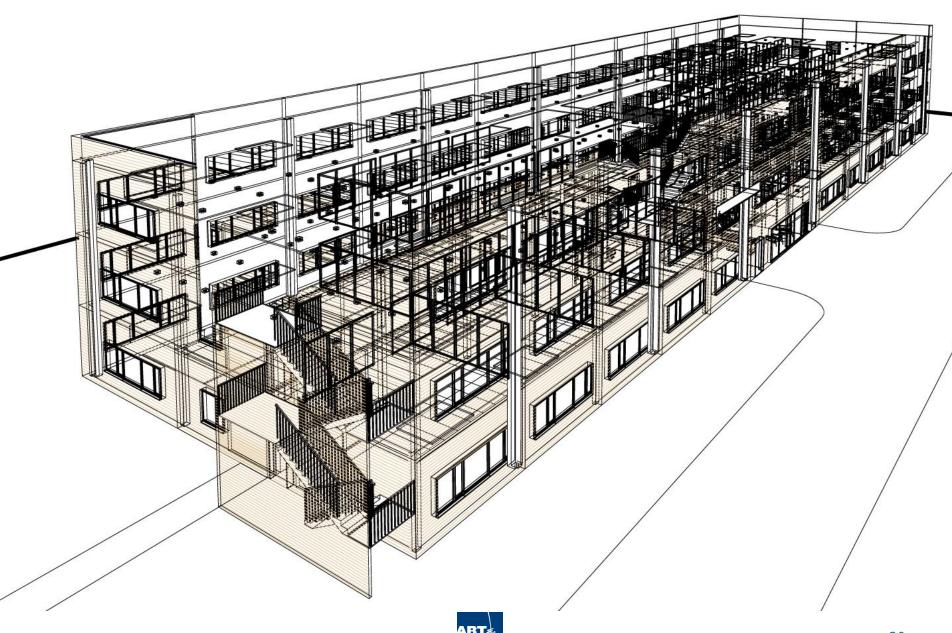


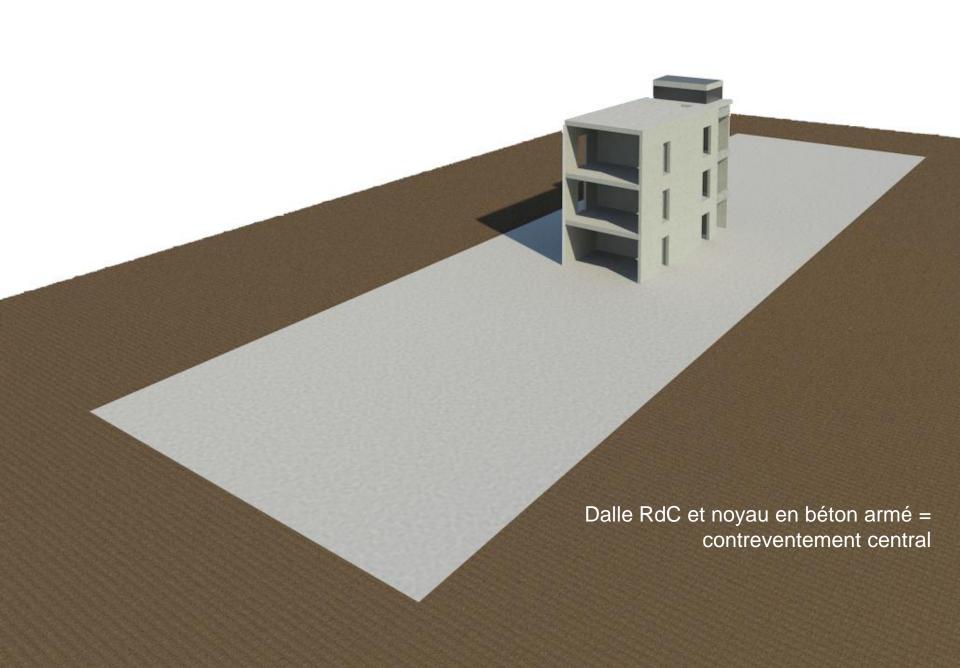

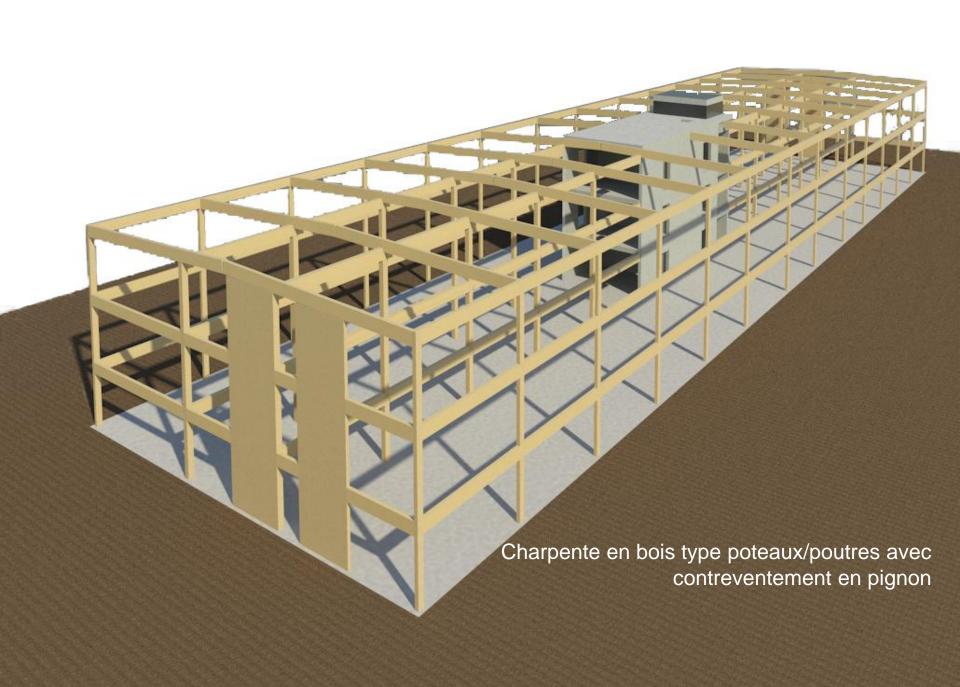

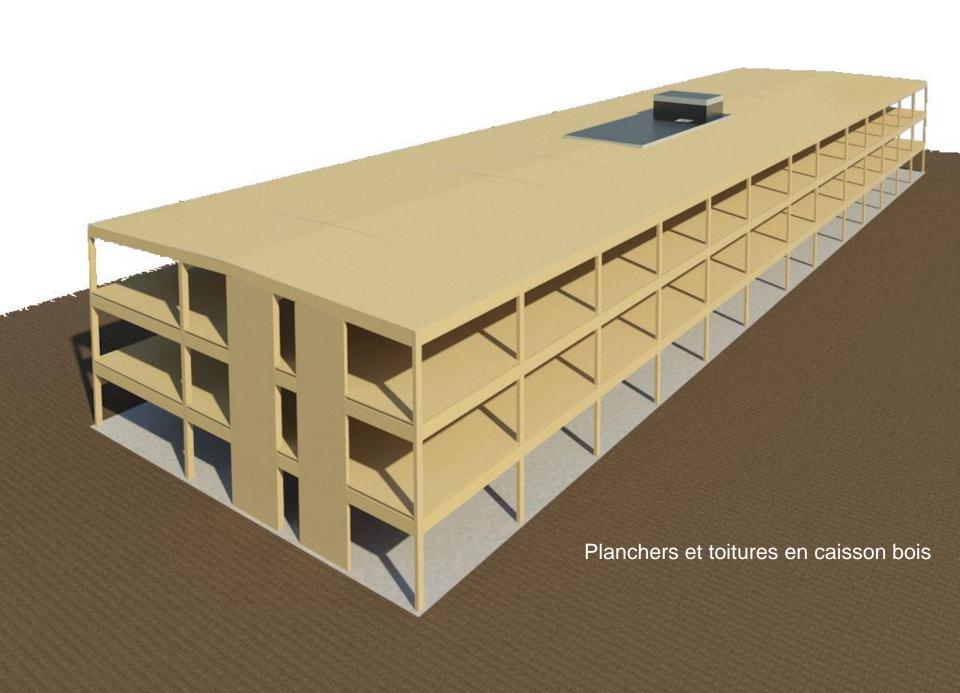



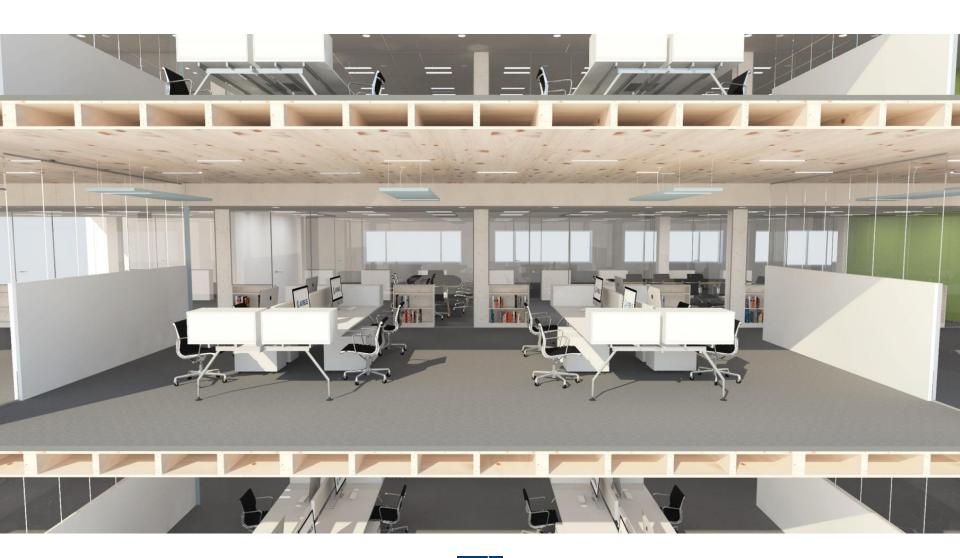


























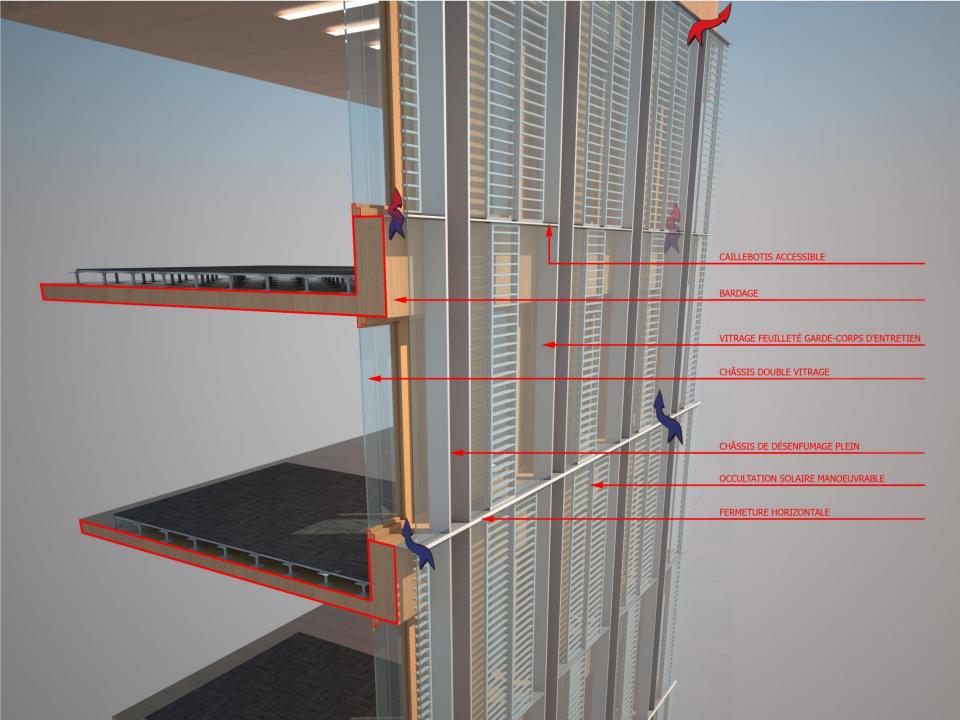















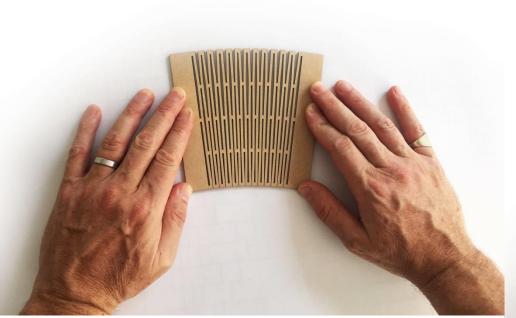

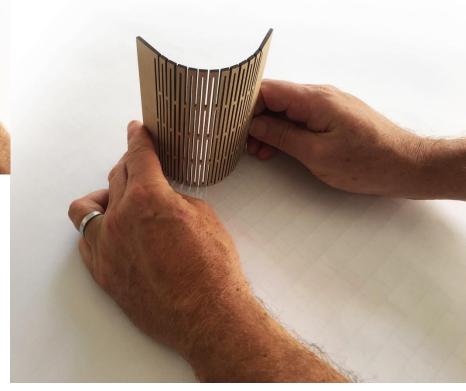




### Recherches




Amteca ag /Christopher T. Hunziker

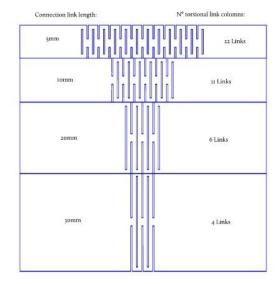





# CHU NANTES

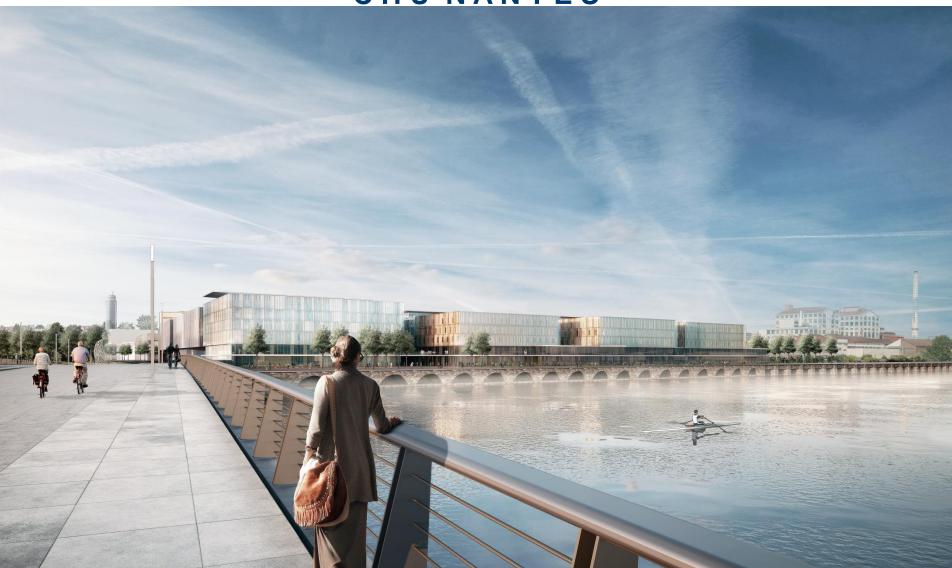



# CHU NANTES





CHU NANTES





**CHUNANTES** 




# TRYO









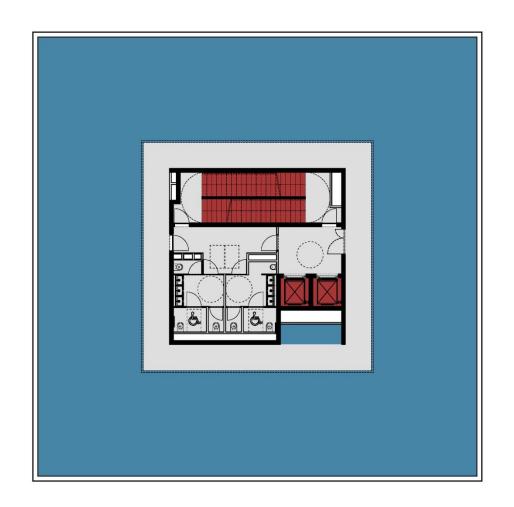




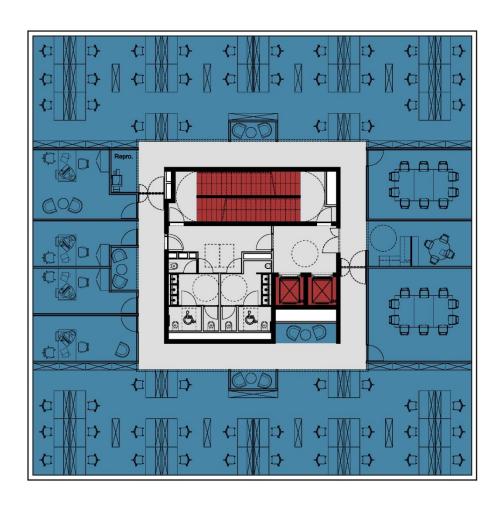




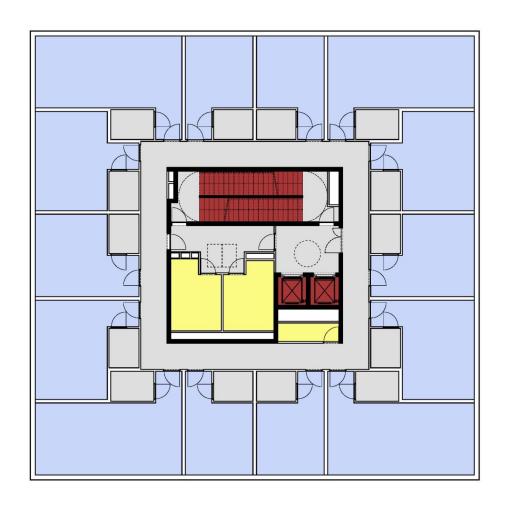




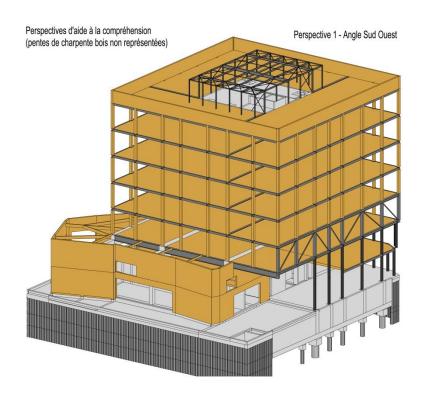

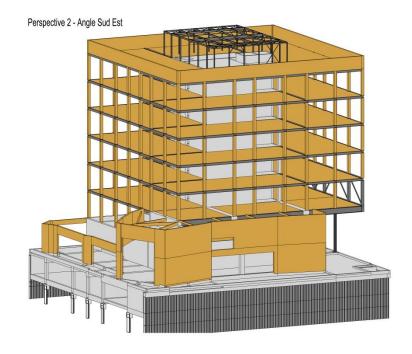



#### 2 Méthodologie chantier

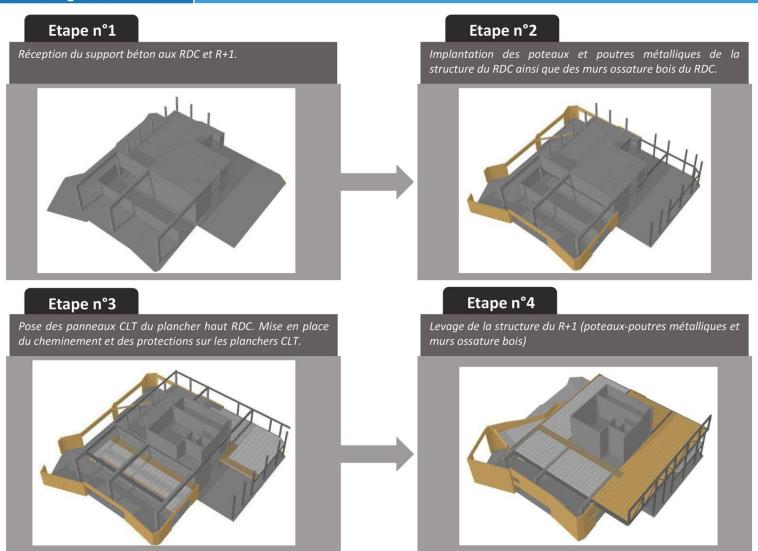


#### Méthodologie chantier

# Étape n°5 Protection plancher Cheminements en CP CLT par écran de soustoiture Delta-vent S


Avant de poser le plancher haut R+1, il faut assembler et lever la poutre-treilli métallique qui assure le porte-à-faux du hall. Elle est temporairement stabilisée par des « tire-pousse » le temps de poser et protéger les planchers CLT.

<u>Détail C-C</u> Liaison Poteau/Poteau + Linteaux tube

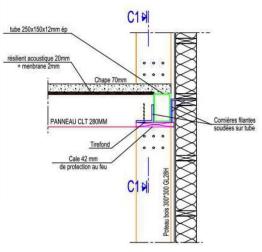




#### A 2 Méthodologie chantier

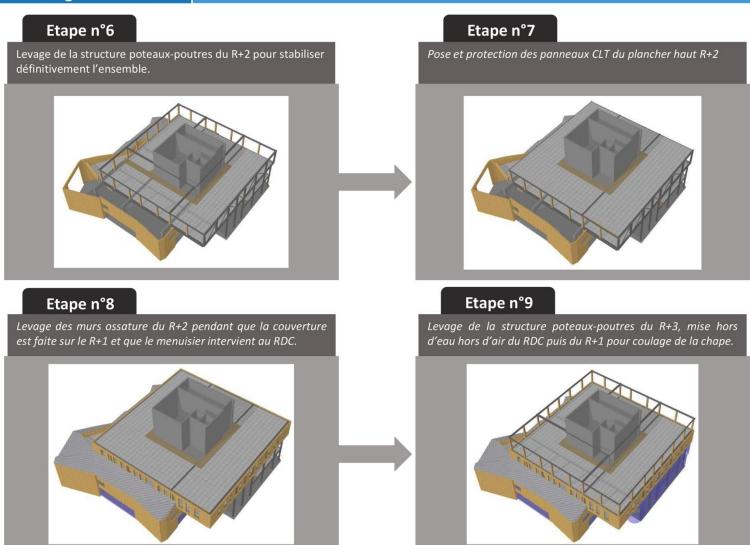



#### A 2 Méthodologie chantier

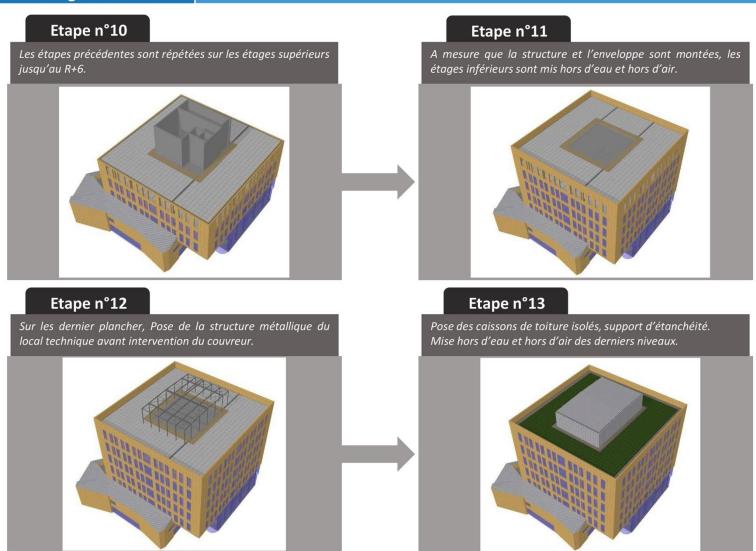



Α

**Organisation chantier** 

Planning

Г	MOIS 06			MOIS 07			$\neg$	MOIS 08			MOIS 09				MOIS 10			MOIS 11			MOIS 12				MOIS 13			MOIS 14			$\neg$	MOIS 15						
ŀ	Décembre 2016		$\vdash$	Janvier 2017			$\dashv$	Février 2017			T	Mars 2017			$\top$	avril-17			mai-17				juin-17			十	juillet-17				août-17			$\neg$	septembre-17			
PRÉPARATION								$\neg$								$\top$			$\neg$								$\top$				一				$\neg$			_
Collecte d'information auprès des intervenants	5							ヿ				1																						TI				
Plans EXE,note de calculs, carnet détails								$\neg$																													$\top$	$\top$
Attente d'acceptation du maître d'ouvrage																																						
Attente d'acceptation du bureau de contrôle																F	Préfa	abrio	atic	on																	$\top$	$\top$
				•													ma	axim	um																			
FABRICATION				П				П				Т							ľ		_														$\neg$		_	_
Fabrication en atelier ossature								$\neg$															T					T						TT	$\neg$	$\top$	$\top$	$\top$
Fabrication en atelier charpente							$\neg$	一																														
·																																						
POSE SUR SITE																																						_
Réception support / Implantation								1																														T
Pose de la structure poteaux-poutres										léce																												
Pose des murs ossature de façade (Loc. Act.)									d	u su	ppo	rt																										
Pose et protection des planchers CLT								$\neg$				$\Gamma$																										
Protection feu								$\neg$								Т																						
Pose des murs ossature de façade (Bureaux)								$\neg$								$\top$					1						1		1			2						
Pose charpente métallique local technique																																						
Pose des caissons de toiture												П																			7						1	
Habillages sous-faces / Finitions																																				1		
																				7/-										1/	1				1			
																						0						W	20									
											Intervention									Intervention																		
								Intervention					possible du																									
									possible du couvreur sur					menuisier et									possible du couvreur sur toiture terrasse															
														couvreur sur																								
										RDC et R+1						R+2																						

#### **A RETENIR**





Opération mixte de logements, bureaux et commerces sur 20.000m². Tour de 60 m de hauteur avec structure primaire et planchers en bois. Avant projet en cours Réalisation 2018.


SILVA









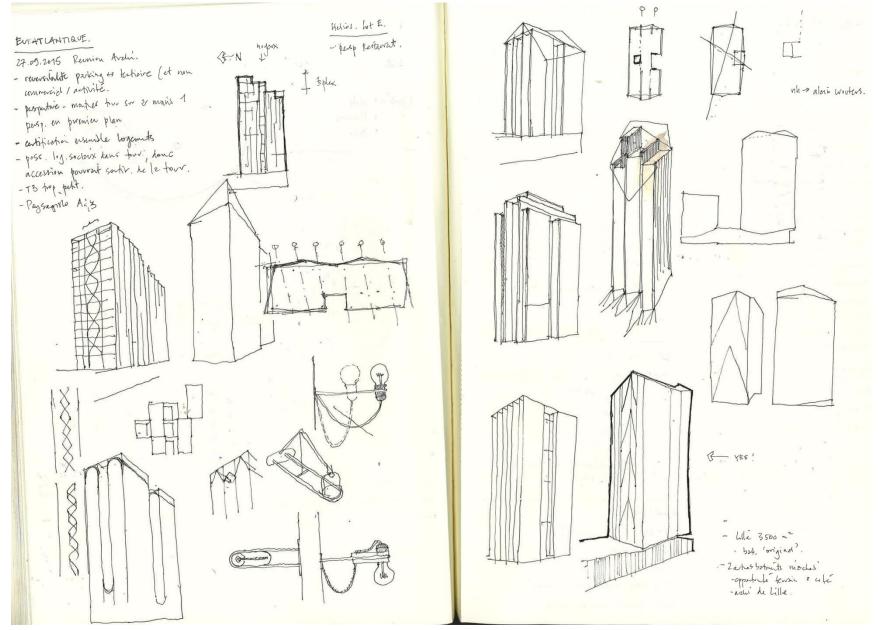



## Etudes paramétriques




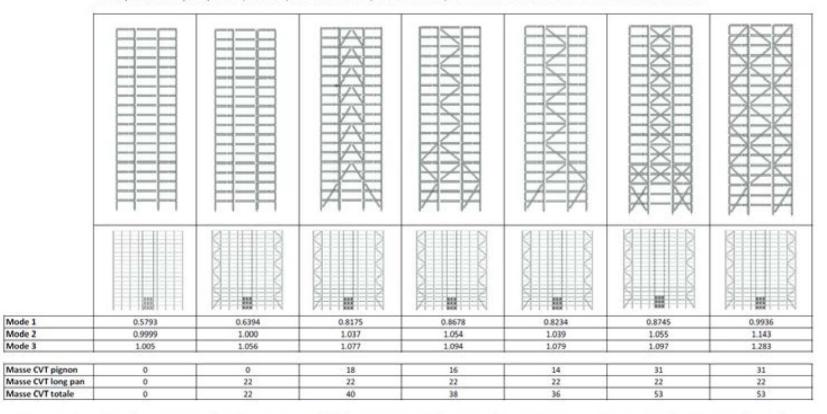


Figure 1: Etude paramétrique sur différents systèmes de contreventement bois en façade




## Etudes de stabilité




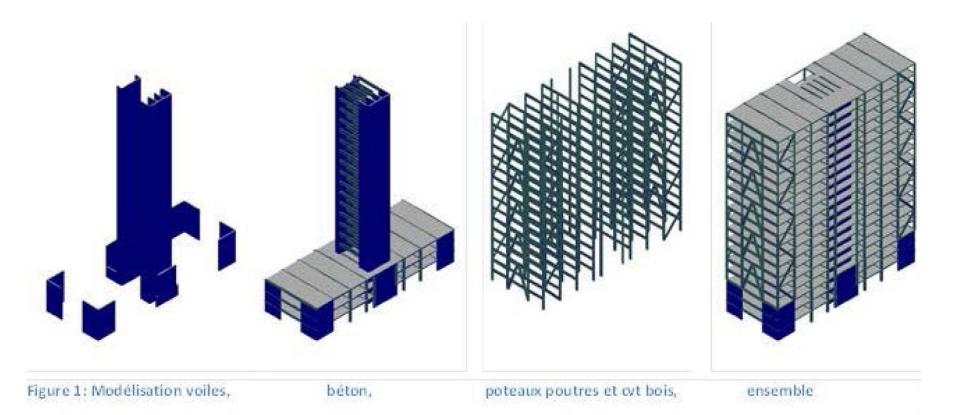

#### Etudes de confort


Le confort des utilisateurs sous cas de charges de vent (suivant critère selon norme DIN 1055)
 en prenant en compte une raideur réduite par la présence des assemblages,

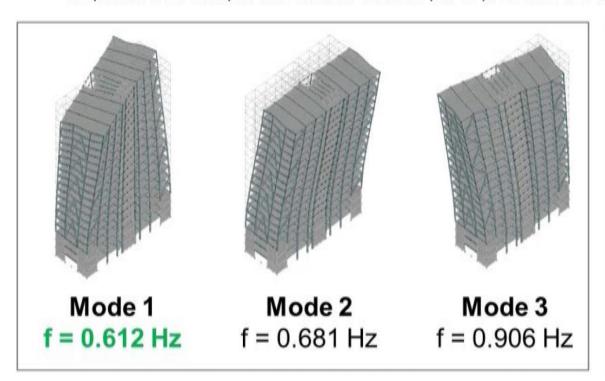

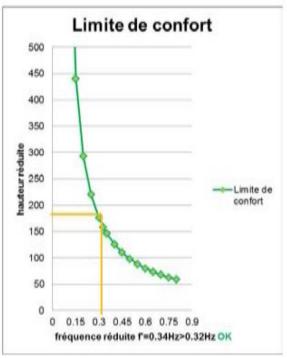



#### Etudes de confort

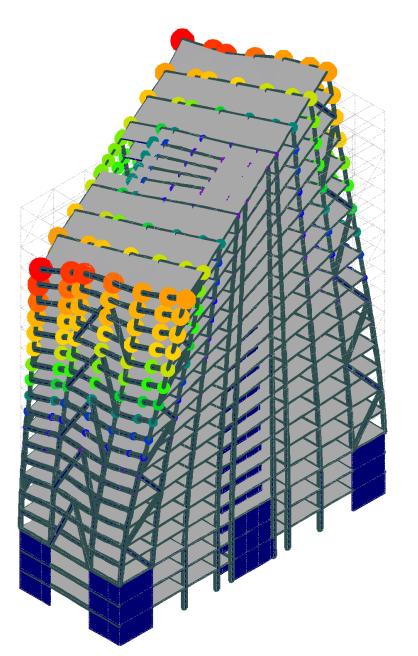

Scale: 1:579,7

Isometric Scale: 1:710,0

Highlighted: Coincident Nodes Coincident Elements

Deformation magnification: 12,50

Resolved Translation, |U|: 2000, mm/pic.cm

Output axis: global

1000, mm 950,0 mm 900,0 mm 850,0 mm 800,0 mm 750,0 mm 700,0 mm 650,0 mm

600,0 mm 550,0 mm 500,0 mm

450,0 mm 400,0 mm 350,0 mm 300,0 mm

250,0 mm 200,0 mm 150,0 mm 100,0 mm

50,00 mm 0,0 mm


Case: A19 : Dynamic : Mode 1

Mode 1

Frequency: 0,6122 Hz Period: 1,633 s

## Etudes séismiques


Le comportement et dimensionnement au séisme de l'ouvrage,

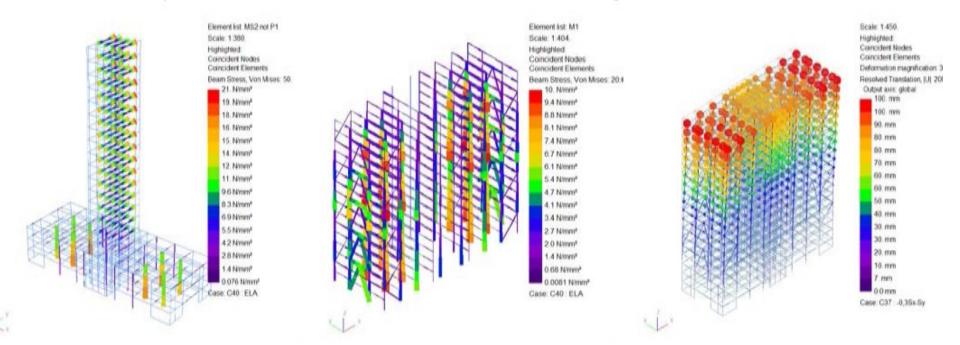



## Etudes de charges

 Le dimensionnement de la structure prenant en compte les charges règlementaires (avec pour le bois la prise en compte des différents K<sub>mod</sub> correspondant dans les combinaisons) ainsi qu'une tenue au feu de 1h30.

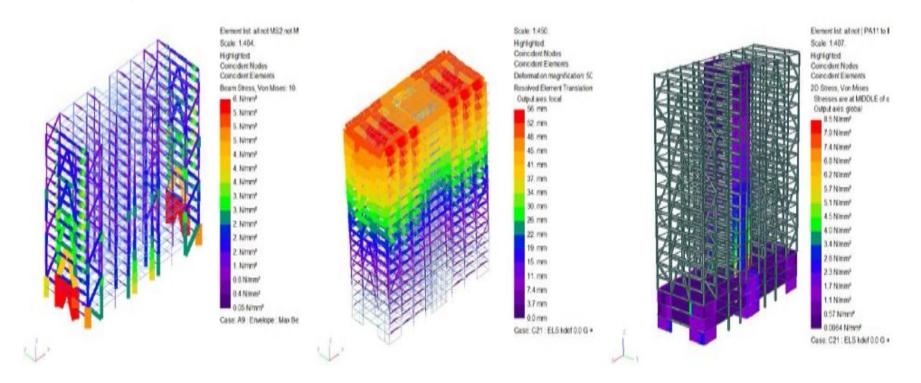



## Liaison de la structure primaire





